



PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS DE SÃO DOMINGOS LOCAL: DIVERSAS RUAS - SÃO DOMINGOS - BREJO DA MADRE DE DEUS / PE. EMPRESA CONTRATADA: COM LUZ CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA RESP. TÉC.: FREDERICO JOSE SAMPAIO RODRIGUES CAVALCANTI - CREA PE PE031820D PE ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241145457 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241114687	PROCESSO LICITATORIO Nº 019/2024 DISPENSA Nº 004/2024 CONTRATO Nº: 109/2024, DATA 15/05/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 156.607,20	ORDEN DE SERVIÇO: 15/05/2024 PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS PRAZO TRANSCORRIDO: 83 DIAS PRAZO RESTANTE: 37 DIAS PRAZO ADITADO: 60 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 003/2024 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 54.799,38 VALOR ACUMULADO: R\$ 110.637,52 % ACUMULADO: 70,65% PERÍODO: 09/07/2024 À 06/08/2024 DATA DE ELABORAÇÃO: 06/08/2024
--	---	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO		3ª Medição		ACUMULADO ATÉ 3ª BM		SALDO	
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				744,84		0,00		744,84		0,00
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	372,42	2,00	744,84		-	2,00	744,84		-
			x								
2.0	REPOSIÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO				155.862,36		20.329,41		109.892,68		45.969,67
2.1	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	74,79	2.084,00	155.862,36	271,82	20.329,41	1.469,35	109.892,68	614,65	45.969,67
TOTAL BM: VINTE MIL, TRZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS.				Total Contrato	156.607,20	Total 3ªBM	20.329,41	Total Acumulado	110.637,52	Total Saldo	45.969,67

Secretário Municipal

Responsável pela Elaboração
JANUÁRIO DUTRA RAMOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 161901751-2

Responsável Técnico Contratada
Documento assinado digitalmente
gov.br FREDERICO JOSE SAMPAIO RODRIGUES CAVAL
Data: 06/08/2024 16:57:47-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Pág. 1 de 1

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA BM03

OBRA: REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE SÃO DOMINGOS.

LOCAL: DIVERSAS RUAS – SÃO DOMINGOS - BREJO DA MADRE DE DEUS / PE.

DATA BASE: 06/08/2024

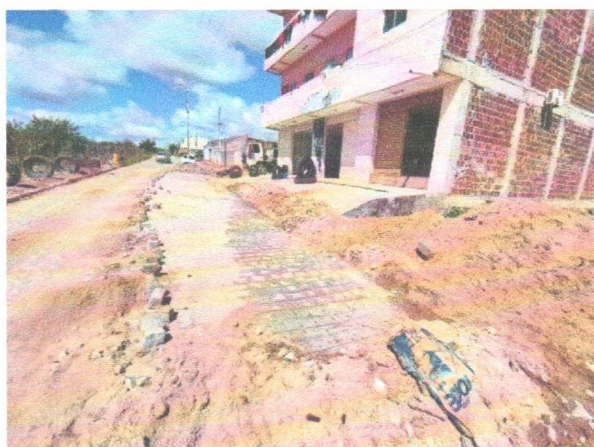


FOTO 01: RUA DA SUBESTAÇÃO;

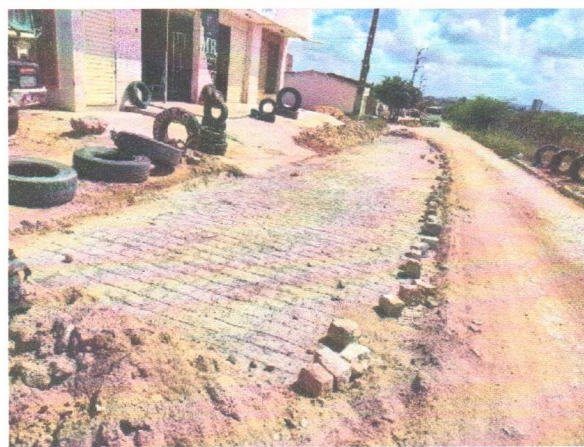


FOTO 02: RUA DA SUBESTAÇÃO;



FOTO 03: RUA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO;



FOTO 04: RUA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO;



FOTO 05: RUA SÃO CARLOS;



FOTO 06: RUA SÃO CARLOS;


SANDRO DUTRA RAMOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 161901751-2



Documento assinado digitalmente
FREDERICO JOSE SAMPAIO RODRIGUES CAVALI
Data: 06/08/2024 16:58:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
