



PREFEITURA DO BREJO DA MADRE DE DEUS
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BOA ESPERANÇA LOCAL: RUA MANOEL BRÁS E RUA PROJETADA - BOA ESPERANÇA - BREJO DA MADRE DE DEUS / PE. EMPRESA CONTRATADA: COM LUZ CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA-ME RESP. TÉCN.: FREDERICO JOSE SAMPAIO RODRIGUES CAVALCANTI - CREA PE 0031820D PE ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241136441 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241096294	PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2024 DISPENSA Nº 003/2024 CONTRATO Nº: 068/2024, DATA 26/04/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 107.060,70 VALOR ADITADO: R\$ 12.705,98 - 11,87%	ORDEN DE SERVIÇO: 26/04/2024 PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS PRAZO TRANSCORRIDO: 53 DIAS PRAZO RESTANTE: 7 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 003/2024 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 29.706,98 VALOR ACUMULADO: R\$ 119.766,68 % ACUMULADO: 100,00% PERÍODO: 04/06/2024 À 18/06/2024 DATA DE ELABORAÇÃO: 18/06/2024
--	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		3ª Medição		ACUMULADO ATÉ 2ª BM		SALDO	
				Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total	Quant.	V. Total
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				743,50		0,00		743,50		0,00
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	371,75	2,00	743,50			2,00	743,50	-	-
			x								
2.0	TERRAPLANAGEM				179,42		42,14		179,42		0,00
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M	0,17	1.055,45	179,42	247,92	42,14	1.055,45	179,42	-	-0,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO				118.843,76		29.664,84		118.843,76		0,00
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M2	91,80	1.055,45	96.890,31	308,38	28.309,29	1.055,45	96.890,31	-	-
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M2	64,55	340,10	21.953,45	21,00	1.355,55	340,10	21.953,45	-	0,00
TOTAL BM 03:				Total 1ª REPROGRAM	119.766,68	Total 3ª BM	29.706,98	Total Acumulado	119.766,68	Total Saldo	0,00
VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS											

Jadiel Gilip de Araújo Salumby
Secretário de Obras
Portaria Nº 319/2023
Secretário Municipal

Sampaio Rodrigues Cavalcanti
Responsável pela Elaboração
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 161901751-2

Responsável Técnico Contratada



Documento assinado digitalmente
FREDERICO JOSE SAMPAIO RODRIGUES CAVALCANTI
Data: 18/06/2024 17:44:16-0300
Verifique em <https://validar.rli.gov.br>

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

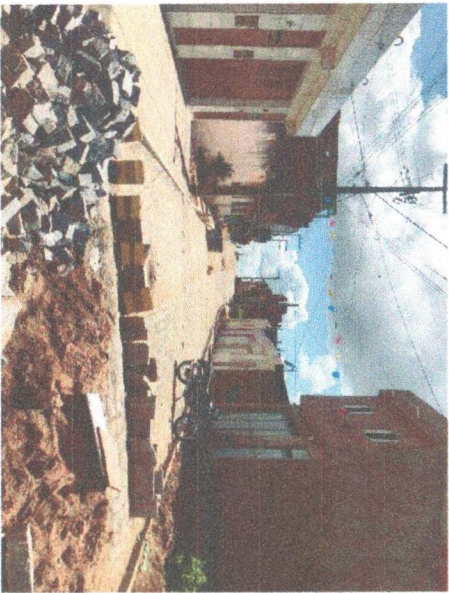
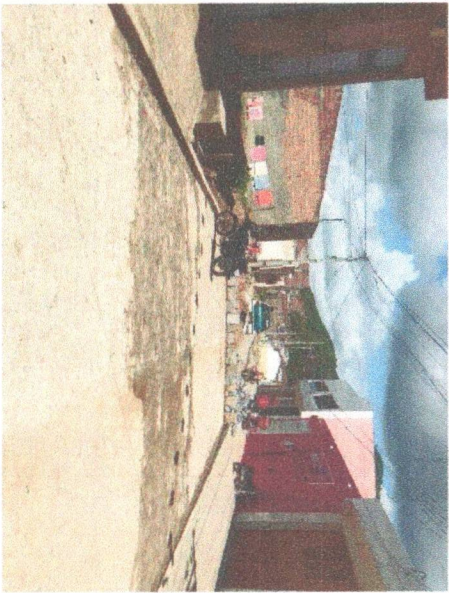
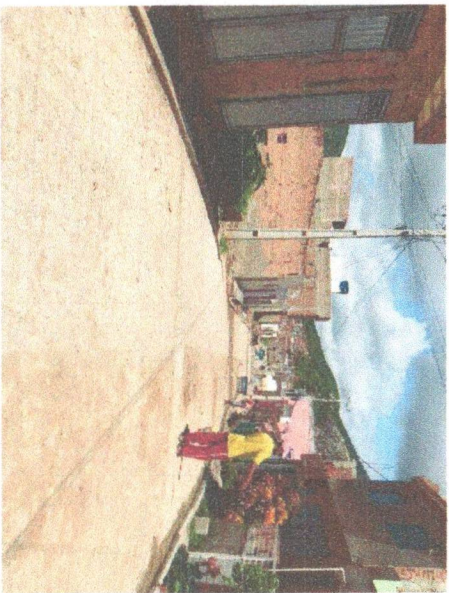
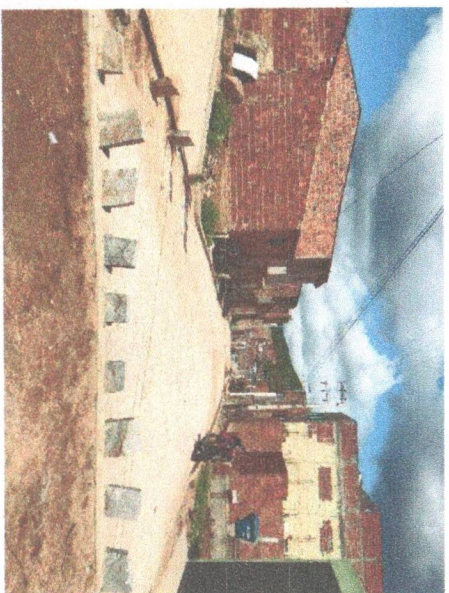
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BOA ESPERANÇA
LOCAL: RUA MANOEL BRÁS E RUA PROJETADA - BAIRRO BOA ESPERANÇA - BREJO DA MADRE DE DEUS / PE.
DATA ELABORAÇÃO: 18/06/2024

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALT/ESP	TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2					
			Placa da obra			2,00		1,00	2,00
			Total Item 1.1						2,00
2.0			TERRAPLANAGEM						
2.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2					
			área de pavimento			1.055,45			1.055,45
			Total Item 2.1					MEDIDO 1.055,45	807,53
								MEDIR 247,92	
3.0			PAVIMENTAÇÃO						
3.1	COMPOSIÇÃO	01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M2					
			Pavimentação em Paralelepípedo				largura média		
			Rua Manoel Brás			10,00	6,90		69,00
						20,00	6,00		120,00
						28,00	6,00		168,00
						23,90	6,00		143,40
						20,60	6,00		123,60
			Rua projetada 01			1,00	6,75		6,75
						42,87	6,00		257,22
			Travessa 02			1,00	6,65		6,65
						5,72	5,95		34,03
			Travessa 03			1,00	6,80		6,80
			Total Item 3.1			20,00	6,00		120,00
								MEDIDO 1.055,45	
								MEDIR 747,07	
									308,38
3.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M2					
			Lado direito e esquerdo						
			Rua Manoel Brás			2,00	10,00		20,00
						2,00	20,00		40,00
						2,00	28,00		56,00
						2,00	23,90		47,80
						2,00	20,70		41,40
			Rua projetada 01			2,00	1,00		2,00
						2,00	43,00		86,00
			Travessa 02			2,00	1,00		2,00
						2,00	5,85		11,70
			Travessa 03			2,00	1,00		2,00
						2,00	20,00		40,00
			Recravas			1,00	7,80		7,80
						1,00	6,00		6,00
			Desconto de entrada das ruas			-1,00	7,35		-7,35
						-1,00	7,75		-7,75
						-1,00	7,50		-7,50
			Total Item 3.2					MEDIDO 340,10	
								MEDIR 319,10	
									21,00

Sando Costa Lima
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 161901751-2

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA BM03

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BOA ESPERANÇA.
LOCAL: BAIRRO BOA ESPERANÇA - BREJO DA MADRE DE DEUS / PE.
DATA BASE: 18/06/2024

	
FOTO 01: Rua Manoel Brás (Pavimentação em Paralelepípedo);	FOTO 02: Rua Manoel Brás (Pavimentação em Paralelepípedo);
	
FOTO 03: Rua Manoel Brás (Pavimentação em Paralelepípedo);	FOTO 04: Rua Projetada01 (Pavimentação em paralelepípedo);
	

Sandro Dutra Ramos
SANDRO DUTRA RAMOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 161901751-2
